PLANNING CHANTIER - MANGOT BAY

Numéro	Tâche	Quantités	Unité d'œuvre	Cadence	Durée	Heures prévues	Date de début	Équipe	Effectif	Horaire journalier	Production prévue	Prédécesseurs	Remarques
1	**MANGOT BAY**				534 j	72 802,3 h	22/08/2022						
2	**Jalons**				108 j		22/08/2022						
3	Lancement de chantier		U		5 j		22/08/2022	Jalon		7,5			
4	Période de préparation		U		103 j		29/08/2022	Jalon		7,5		3FD	
5	**VRD - PAROIS**				100 j		10/10/2022						
6	Période de préparation		U		30 j		10/10/2022	Suivi Sous traitant Terrassement		7,4		3FD+30	
7	Parois Batiment A / B + Parking		m3		13 j		24/11/2022	Suivi Sous traitant Terrassement		7,4		6FD	Delai A confirmer
8	Terrassement pleine masse Batiment A / B + Parking		m3		70 j		24/11/2022	Suivi Sous traitant Terrassement		7,4		7DD	Delai a confirmer
9	Livraison PF + Parois		U		1 j		02/03/2023	Jalon		7,5		7FD+50	
10	**Préparation**				113 j	943,8 h	31/01/2023						
11	Installation chantier		U		10 j	162 h	31/01/2023	Installations	2 Q	8,1		4FD	
12	Implantations Batiment B + Zone parking		m²		10 j	74 h	14/02/2023	Implantation	1 Q	7,4		11FD	
13	Implantations Batiment A		m²		5 j	37 h	31/03/2023	Implantation	1 Q	7,4		12FD+20	
14	Fondation Grue G1		U		5 j	81 h	14/02/2023	Installations	2 Q	8,1		11FD	
15	Montage Grue G1		U		3 j	24,3 h	23/02/2023	Installations	1 Q	8,1		14FD	
16	Fondation Grue G2		U		5 j	81 h	11/04/2023	Installations	2 Q	8,1		14FD+30	
17	Montage Grue G2		U		5 j	40,5 h	18/04/2023	Installations	1 Q	8,1		16FD	
18	Montage banches BAT B		u		5 j	148 h	19/04/2023	Montage / replis matériel	4 Q	7,4			
19	Préparation PTE BAT B		u		5 j	74 h	17/07/2023	Montage / replis matériel	2 Q	7,4		82DD-5	
20	Montage banches BAT A		u		5 j	148 h	17/07/2023	Montage / replis matériel	4 Q	7,4		82DD-5	
21	Préparation PTE BAT A		u		5 j	74 h	04/07/2023	Montage / replis matériel	2 Q	7,4			
22	**G1**				384 j	36 916,2 h	14/03/2023						
23	**PARKING PK**				212 j	4 220,1 h	14/03/2023						
24	**Fondations PK +12.78m**				171 j	1 547,1 h	14/03/2023						
25	Suivi Terrassement complémentaires		m3		14 j		14/03/2023	Suivi Sous traitant Terrassement		7,4			compris suivi réseaux
26	Gros Béton / BP	20	m3	4 m3/j	5 j	40,5 h	17/03/2023	Fondations G1	1 Q	8,1	2,03 h/m3		
27	Semelles isolées	43	U	2,15 U/j	20 j	162 h	24/03/2023	Fondations G1	1 Q	8,1	3,77 h/U	26FD	
28	Semelles filantes	115	ml	5,75 ml/j	20 j	162 h	31/05/2023	Fondations G1	1 Q	8,1	1,41 h/ml	27FD+20	
29	Libages	115	ml	5,48 ml/j	21 j	340,2 h	28/06/2023	Fondations G1	2 Q	8,1	2,96 h/ml	28FD	
30	Longrines préfa	223	ml	10,62 ml/j	21 j	340,2 h	13/04/2023	Fondations G1	2 Q	8,1	1,53 h/ml	27FD-9	
31	Amorces poteaux	28	U	2,15 U/j	13 j	210,6 h	23/05/2023	Fondations G1	2 Q	8,1	7,52 h/U	30FD+3	
32	Plancher Prédalles +12.78m	970	m²	80,83 m²/j	12 j	291,6 h	08/11/2023	Dallage G1	3 Q	8,1	0,3 h/m²	30DD+140	
33	**SS-1 PK**				18 j	1 069,2 h	15/11/2023						
34	Voiles Ht<3.80m PK	115	ml	9,58 ml/j	12 j	388,8 h	15/11/2023	Voiles G1	4 Q	8,1	3,38 h/ml	32FD-7	0.80h/m² _ Ferraillage ST
35	Pose prémurs PK	11	U	0,92 U/j	12 j	194,4 h	15/11/2023	Voiles G1	2 Q	8,1	17,67 h/U	34DD	Equipe dans voile
36	Poteaux PK	21	U	1,75 U/j	12 j	97,2 h	15/11/2023	Poteaux G1	1 Q	8,1	4,63 h/U	34DD	
37	Poutres Préfas PK	30	U	2,5 U/j	12 j	97,2 h	15/11/2023	Poutres G1	1 Q	8,1	3,24 h/U	34DD	
38	Plancher PK	970	m²	80,83 m²/j	12 j	291,6 h	23/11/2023	Planchers G1	3 Q	8,1	0,3 h/m²	34DD+6	ETA + Prédalle / Coulage ST
39	Escalier PK	2	u	0,17 u/j	12 j		23/11/2023	Escaliers		8,1		38DD	
40	**RDC PK**				36 j	1 603,8 h	01/12/2023						
41	Voiles Ht<3.80m PK	115	ml	9,58 ml/j	12 j	388,8 h	01/12/2023	Voiles G1	4 Q	8,1	3,38 h/ml	34FD	0.80h/m² / Ferraillage ST
42	Pose prémurs PK	11	U	3,67 U/j	3 j	48,6 h	01/12/2023	Voiles G1	2 Q	8,1	4,42 h/U	41DD	Equipe dans voile
43	Poteaux PK	21	U	1,75 U/j	12 j	97,2 h	01/12/2023	Poteaux G1	1 Q	8,1	4,63 h/U	36FD	
44	Poutres Préfas PK	30	U	2,5 U/j	12 j	97,2 h	01/12/2023	Poutres G1	1 Q	8,1	3,24 h/U	37FD	
45	Plancher PK	970	m²	80,83 m²/j	12 j	291,6 h	11/12/2023	Planchers G1	3 Q	8,1	0,3 h/m²	38FD	ETA + Prédalle / Coulage ST
46	Escalier PK	2	u	0,17 u/j	12 j		11/12/2023	Escaliers		8,1		45DD	Equipe dans plancher
47	**R+1 PK**				24 j	680,4 h	19/12/2023						
48	Voiles Ht<3.80m PK	23	ml	1,92 ml/j	12 j	388,8 h	19/12/2023	Voiles G1	4 Q	8,1	16,9 h/ml	41FD	0.80h/m² / Ferraillage ST
49	Plancher PK	970	m²	80,83 m²/j	12 j	291,6 h	12/01/2024	Planchers G1	3 Q	8,1	0,3 h/m²	48FD	ETA + Prédalle / Coulage ST
50	**Batiment B1-B2**				384 j	32 696,1 h	14/03/2023						
154	**G2**				213 j	14 507,1 h	14/04/2023						
155	**Batiment A**				213 j	14 507,1 h	14/04/2023						
156	**Fondations**				71 j	996,3 h	14/04/2023						
157	Suivi Terrassement complémentaires		m3		11 j		14/04/2023	Suivi Sous traitant Terrassement		7,4		17FD-7	compris suivi réseaux
158	Fosses ascenseurs	1	U	0,2 U/j	5 j	40,5 h	17/04/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	40,5 h/U	157DD+1	
159	Gros Béton	152	m3	7,6 m3/j	20 j	162 h	15/05/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	1,07 h/m3	158FD+13	
160	Semelles isolées	24	U	4 U/j	6 j	48,6 h	25/05/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	2,03 h/U	158FD+19	
161	Redans	20	ml	2,22 ml/j	9 j	72,9 h	05/06/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	3,65 h/ml	160FD	
162	Semelles Filantes	174	ml	15,82 ml/j	11 j	178,2 h	16/06/2023	Fondations G2	2 Q	8,1	1,02 h/ml	160FD+9	
163	Libages	199	ml	22,11 ml/j	9 j	145,8 h	01/06/2023	Fondations G2	2 Q	8,1	0,73 h/ml	160DD+4	
164	Longrines + amorces poteaux	192	ml	21,33 ml/j	9 j	145,8 h	22/06/2023	Fondations G2	2 Q	8,1	0,76 h/ml	163FD+6	
165	Plancher prédalles +8.70m	368	m²	36,8 m²/j	10 j	162 h	12/06/2023	Dallage G2	2 Q	8,1	0,44 h/m²	163DD+7	
166	Etanchéité + remblai ctr VGH	1	ens	0,2 ens/j	5 j		18/07/2023	Suivi Sous traitant Terrassement		7,4			
167	Redans	10	ml	2 ml/j	5 j	40,5 h	25/07/2023	Fondations G1	1 Q	8,1	4,05 h/ml	166FD	
168	**SS-2**				34 j	1 522,8 h	29/06/2023						
169	Semelles Filantes derrière VGH SS2	20	ml	6,67 ml/j	3 j	24,3 h	01/08/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	1,22 h/ml	167FD	
170	Semelles isolées SS2	6	U	2 U/j	3 j	24,3 h	05/07/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	4,05 h/U	164FD	
171	Semelles Filantes SS2	57	ml	19 ml/j	3 j	24,3 h	10/07/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	0,43 h/ml	170FD	
172	Libages + Longrines SS2	95	ml	8,64 ml/j	11 j	89,1 h	13/07/2023	Fondations G2	1 Q	8,1	0,94 h/ml	171FD	
173	Plancher Prédalles +11.42m SS2	349	m²	69,8 m²/j	5 j	81 h	12/07/2023	Dallage G2	2 Q	8,1	0,23 h/m²	165FD+12	
174	Plancher Prédalles +10.06m SS2	284	m²	71 m²/j	4 j	64,8 h	20/07/2023	Dallage G2	2 Q	8,1	0,23 h/m²	173FD	
175	Voiles 1 Face Ht=2.77m SS2	25	ml	6,25 ml/j	4 j	97,2 h	29/06/2023	Voiles G1	3 Q	8,1	3,89 h/ml		
176	Voiles Grande Hauteur ht=4.08m SS2	51	ml	6,38 ml/j	8 j	259,2 h	05/07/2023	Voiles G2	4 Q	8,1	5,08 h/ml	175FD	1h/m² / Ferraillage ST
177	Voiles Ht<3.80m SS2	140	ml	11,67 ml/j	12 j	388,8 h	18/07/2023	Voiles G2	4 Q	8,1	2,78 h/ml		0.88h/m² / Ferraillage ST - Voile une face 52ml
178	Poteaux SS2	11	U	0,92 U/j	12 j		18/07/2023	Poteaux poutres G2		8,1		177DD	
179	Poutres SS2	20	U	1,67 U/j	12 j	97,2 h	20/07/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	4,86 h/U	178DD+2	
180	Platelage pour poutre CSP SS2	1	ens	0,08 ens/j	12 j	194,4 h	20/07/2023	Poutres G1	2 Q	8,1	194,4 h/ens	179DD	
181	Plancher PHSS2 SS2	639	m²	58,09 m²/j	11 j	178,2 h	26/07/2023	Planchers G2	2 Q	8,1	0,28 h/m²	174FD	ETA + Prédalle / Coulage ST
182	Escalier SS2	3	u	0,19 u/j	16 j		26/07/2023	Escaliers		8,1		181DD	Equipe dans plancher
183	**SS-1**				23 j	1 530,9 h	03/08/2023						
184	Voiles Ht<3.80m	109	ml	13,63 ml/j	8 j	388,8 h	03/08/2023	Voiles G2	6 Q	8,1	3,57 h/ml	177FD	1.32h/m² / Ferraillage ST - Voile une face
185	Voiles Circulaires Ht=2.77m	27	ml	6,75 ml/j	4 j	97,2 h	03/08/2023	Voiles G1	3 Q	8,1	3,6 h/ml	184DD	0.94h/m² / Ferraillage ST / voile une face
186	Pose prémurs	16	U	2,29 U/j	7 j	170,1 h	16/08/2023	Voiles G1	3 Q	8,1	10,63 h/U	184FD	Equipe dans voile
187	Poteaux	10	U	0,56 U/j	18 j	145,8 h	07/08/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	14,58 h/U	178FD+2	
188	Poutres	20	U	1,11 U/j	18 j	145,8 h	07/08/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	7,29 h/U	179FD	
189	Platelage pour poutre CSP	1	ens	0,06 ens/j	18 j	291,6 h	07/08/2023	Poutres G1	2 Q	8,1	291,6 h/ens	188DD	
190	Plancher	639	m²	35,5 m²/j	18 j	291,6 h	10/08/2023	Planchers G2	2 Q	8,1	0,46 h/m²	181FD	ETA + Prédalle / Coulage ST
191	Escalier	3	u	0,17 u/j	18 j		10/08/2023	Escaliers		8,1		190DD	
192	**RDC**				31 j	1 312,2 h	25/08/2023						
193	Voiles Ht3.80m	166	ml	10,38 ml/j	16 j	777,6 h	25/08/2023	Voiles G2	6 Q	8,1	4,68 h/ml	186FD	1.12h/m² / Ferraillage ST
194	Voiles Circulaires Ht=2.77m	27	ml	6,75 ml/j	4 j	64,8 h	25/08/2023	Voiles G1	2 Q	8,1	2,4 h/ml	193DD	0.94h/m² / Ferraillage ST / voile une face
195	Pose prémurs	12	U	1,71 U/j	7 j	170,1 h	31/08/2023	Voiles G1	3 Q	8,1	14,18 h/U	194FD	Equipe dans voile
196	Poteaux	9	U	0,69 U/j	13 j	105,3 h	01/09/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	11,7 h/U	187FD	
197	Poutres Préfas	19	U	1,46 U/j	13 j		01/09/2023	Poteaux poutres G2		8,1		188FD	Equipe poutres
198	Poutres CSP	49	ml	3,77 ml/j	13 j		01/09/2023	Poteaux poutres G2		8,1		197DD	equipe poutres
199	Plancher PHRDC	843	m²	70,25 m²/j	12 j	194,4 h	06/09/2023	Planchers G2	2 Q	8,1	0,23 h/m²	190FD	ETA + Prédalle / Coulage ST
200	Escalier	3	u	0,13 u/j	23 j		06/09/2023	Escaliers		8,1		199DD	Equipe dans plancher
201	**R+1**				15 j	980,1 h	18/09/2023						
202	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	18/09/2023	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	193FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
203	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		18/09/2023	Voiles G2		8,1		202DD	Equipe dans voiles
204	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		20/09/2023	Poteaux poutres G2		8,1		196FD	Equipe poutres
205	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	20/09/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	198FD	Dont 3 poutres CSP
206	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	22/09/2023	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	199FD	
207	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		22/09/2023	Escaliers		8,1		206DD	Equipe dans plancher
208	**R+2**				15 j	980,1 h	03/10/2023						
209	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	03/10/2023	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	202FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
210	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		03/10/2023	Voiles G2		8,1		209DD	Equipe dans voiles
211	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		05/10/2023	Poteaux poutres G2		8,1		204FD	Equipe poutre
212	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	05/10/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	205FD	Dont 3 poutres CSP
213	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	09/10/2023	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	206FD	
214	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		09/10/2023	Escaliers		8,1		213DD	Equipe dans plancher
215	**R+3**				15 j	980,1 h	18/10/2023						
216	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	18/10/2023	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	209FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
217	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		18/10/2023	Voiles G2		8,1		216DD	Equipe dans voiles
218	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		20/10/2023	Poteaux poutres G2		8,1		211FD	Equipe poutre
219	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	20/10/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	212FD	Dont 3 poutres CSP
220	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	24/10/2023	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	213FD	
221	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		24/10/2023	Escaliers		8,1		220DD	Equipe dans plancher
222	**R+4**				15 j	980,1 h	06/11/2023						
223	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	06/11/2023	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	216FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
224	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		06/11/2023	Voiles G2		8,1		223DD	Equipe dans voiles
225	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		08/11/2023	Poteaux poutres G2		8,1		218FD	Equipe poutre
226	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	08/11/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	219FD	Dont 3 poutres CSP
227	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	10/11/2023	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	220FD	
228	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		10/11/2023	Escaliers		8,1		227DD	Equipe dans plancher
229	**R+5**				15 j	980,1 h	21/11/2023						
230	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	21/11/2023	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	223FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
231	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		21/11/2023	Voiles G2		8,1		230DD	Equipe dans voiles
232	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		23/11/2023	Poteaux poutres G2		8,1		225FD	Equipe poutre
233	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	23/11/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	226FD	Dont 3 poutres CSP
234	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	27/11/2023	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	227FD	
235	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		27/11/2023	Escaliers		8,1		234DD	Equipe dans plancher
236	**R+6**				15 j	980,1 h	06/12/2023						
237	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	06/12/2023	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	230FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
238	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		06/12/2023	Voiles G2		8,1		237DD	Equipe dans voiles
239	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		08/12/2023	Poteaux poutres G2		8,1		232FD	Equipe poutre
240	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	08/12/2023	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	233FD	Dont 3 poutres CSP
241	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	12/12/2023	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	234FD	
242	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		12/12/2023	Escaliers		8,1		241DD	Equipe dans plancher
243	**R+7**				15 j	980,1 h	21/12/2023						
244	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	21/12/2023	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	237FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
245	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		21/12/2023	Voiles G2		8,1		244DD	Equipe dans voiles
246	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		02/01/2024	Poteaux poutres G2		8,1		239FD	Equipe poutre
247	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	02/01/2024	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	240FD	Dont 3 poutres CSP
248	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	04/01/2024	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	241FD	
249	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		04/01/2024	Escaliers		8,1		248DD	Equipe dans plancher
250	**R+8**				15 j	980,1 h	15/01/2024						
251	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	15/01/2024	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	244FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
252	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		15/01/2024	Voiles G2		8,1		251DD	Equipe dans voiles
253	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		17/01/2024	Poteaux poutres G2		8,1		246FD	Equipe poutre
254	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	17/01/2024	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	247FD	Dont 3 poutres CSP
255	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	19/01/2024	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	248FD	
256	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		19/01/2024	Escaliers		8,1		255DD	Equipe dans plancher
257	**R+9**				15 j	980,1 h	30/01/2024						
258	Voiles Ht<3.80m	184	ml	16,73 ml/j	11 j	445,5 h	30/01/2024	Voiles G2	5 Q	8,1	2,42 h/ml	251FD	0.87h/m² / Ferraillage ST
259	Acrotère balcon	26	ml	2,36 ml/j	11 j		30/01/2024	Voiles G2		8,1		258DD	Equipe dans voiles
260	Poteaux	4	U	0,36 U/j	11 j		01/02/2024	Poteaux poutres G2		8,1		253FD	
261	Poutres Préfas	15	U	1,36 U/j	11 j	89,1 h	01/02/2024	Poteaux poutres G2	1 Q	8,1	5,94 h/U	254FD	Dont 3 poutres CSP
262	Plancher	477	m²	43,36 m²/j	11 j	445,5 h	05/02/2024	Planchers G2	5 Q	8,1	0,93 h/m²	255FD	
263	Escalier	3	u	0,27 u/j	11 j		05/02/2024	Escaliers		8,1		262DD	Equipe dans plancher
264	**TT**				10 j	324 h	16/02/2024						
265	Voile Ht<3.80m	15	ml	3 ml/j	5 j	81 h	16/02/2024	Voiles G2	2 Q	8,1	5,4 h/ml	258FD	1.61h/m² Compris acrotére
266	Voile rampant Ht 1.89m	16	ml	3,2 ml/j	5 j	81 h	23/02/2024	Voiles G2	2 Q	8,1	5,06 h/ml	265FD	1.61h/m² Compris acrotére
267	Acrotére	46	ml	4,6 ml/j	10 j	162 h	16/02/2024	Voiles G2	2 Q	8,1	3,52 h/ml	265DD	Heure dans equipe voile
268	**Préfabrication**				142 j		21/07/2023						
269	Poutres SS-2	20	U	1,11 U/j	18 j		21/07/2023	Préfabrications poutres G2		8,1		179DD+1	Equipe Poutres G3
270	Poutres SS-1	20	U	0,77 U/j	26 j		08/08/2023	Préfabrications poutres G2		8,1		188DD+1	Equipe Poutres G3
271	Poutres RDC	19	U	0,83 U/j	23 j		04/09/2023	Préfabrications poutres G2		8,1		197DD+1	Equipe Poutres G3
272	Poutres R+1 à R+9	135	U	1,36 U/j	99 j		21/09/2023	Préfabrications poutres G2		8,1		205DD+1	Equipe Poutres G3
273	**Replis G1**				10 j	231 h	09/09/2024						
274	Replis matériel	1	ens	0,2 ens/j	5 j	185 h	09/09/2024	Montage / replis matériel	5 Q	7,4	185 h/ens	142FD	
275	Démontage grue	1	U	0,2 U/j	5 j	46 h	16/09/2024	Grutier	1 Q	9,2	46 h/U	274FD	
276	**Replis G2**				10 j	231 h	22/02/2024						
277	Replis matériel	1	ens	0,2 ens/j	5 j	185 h	22/02/2024	Montage / replis matériel	5 Q	7,4	185 h/ens	263FD	
278	Démontage grue	1	U	0,2 U/j	5 j	46 h	29/02/2024	Grutier	1 Q	9,2	46 h/U	277FD	
279	**Indivis**				411 j	19 973,2 h	23/02/2023						
280	Finitions voiles G1	15976	m²	66,57 m²/j	240 j	3 552 h	23/03/2023	Finitions G1	2 Q	7,4	0,22 h/m²		2 faces + Poteaux
281	Finitions Planchers G1	18796	m²	78,32 m²/j	240 j	3 552 h	07/07/2023	Finitions G1	2 Q	7,4	0,19 h/m²		1 face
282	Finitions voiles G2	14500	m²	72,5 m²/j	200 j	2 960 h	06/07/2023	Finitions G2	2 Q	7,4	0,2 h/m²		2 faces + Poteaux
283	Finitions Planchers G2	6280	m²	39,25 m²/j	160 j	1 184 h	27/07/2023	Finitions G2	1 Q	7,4	0,19 h/m²	181DD+1	1 face
284	Grutier G1	1	ens	0 ens/j	356 j	3 275,2 h	23/02/2023	Grutier	1 Q	9,2	3275,2 h/ens	15DD	
285	Grutier G2	1	ens	0,01 ens/j	187 j	1 720,4 h	18/04/2023	Grutier	1 Q	9,2	1720,4 h/ens	17DD	
286	Reprise avant livraisons 6% G1	1	ens	0,04 ens/j	28 j	2 486,4 h	23/09/2024	Reprise avant livraisons 6%	12 Q	7,4	2486,4 h/ens	275FD	
287	Reprise avant livraisons 6% G2	1	ens	0,04 ens/j	28 j	1 243,2 h	08/03/2024	Reprise avant livraisons 6%	6 Q	7,4	1243,2 h/ens	278FD	
288	**Frais de chantier**				5 j		02/01/2023						

Code couleur des colonnes
Jours fériés
Aujourd'hui
Jours de provision d'intempéries/Aléas

	Heures	Frais de chantier
Feuille de vente	0h	
Planning HO	72 802h	
Reste à justifier	-72 802h	

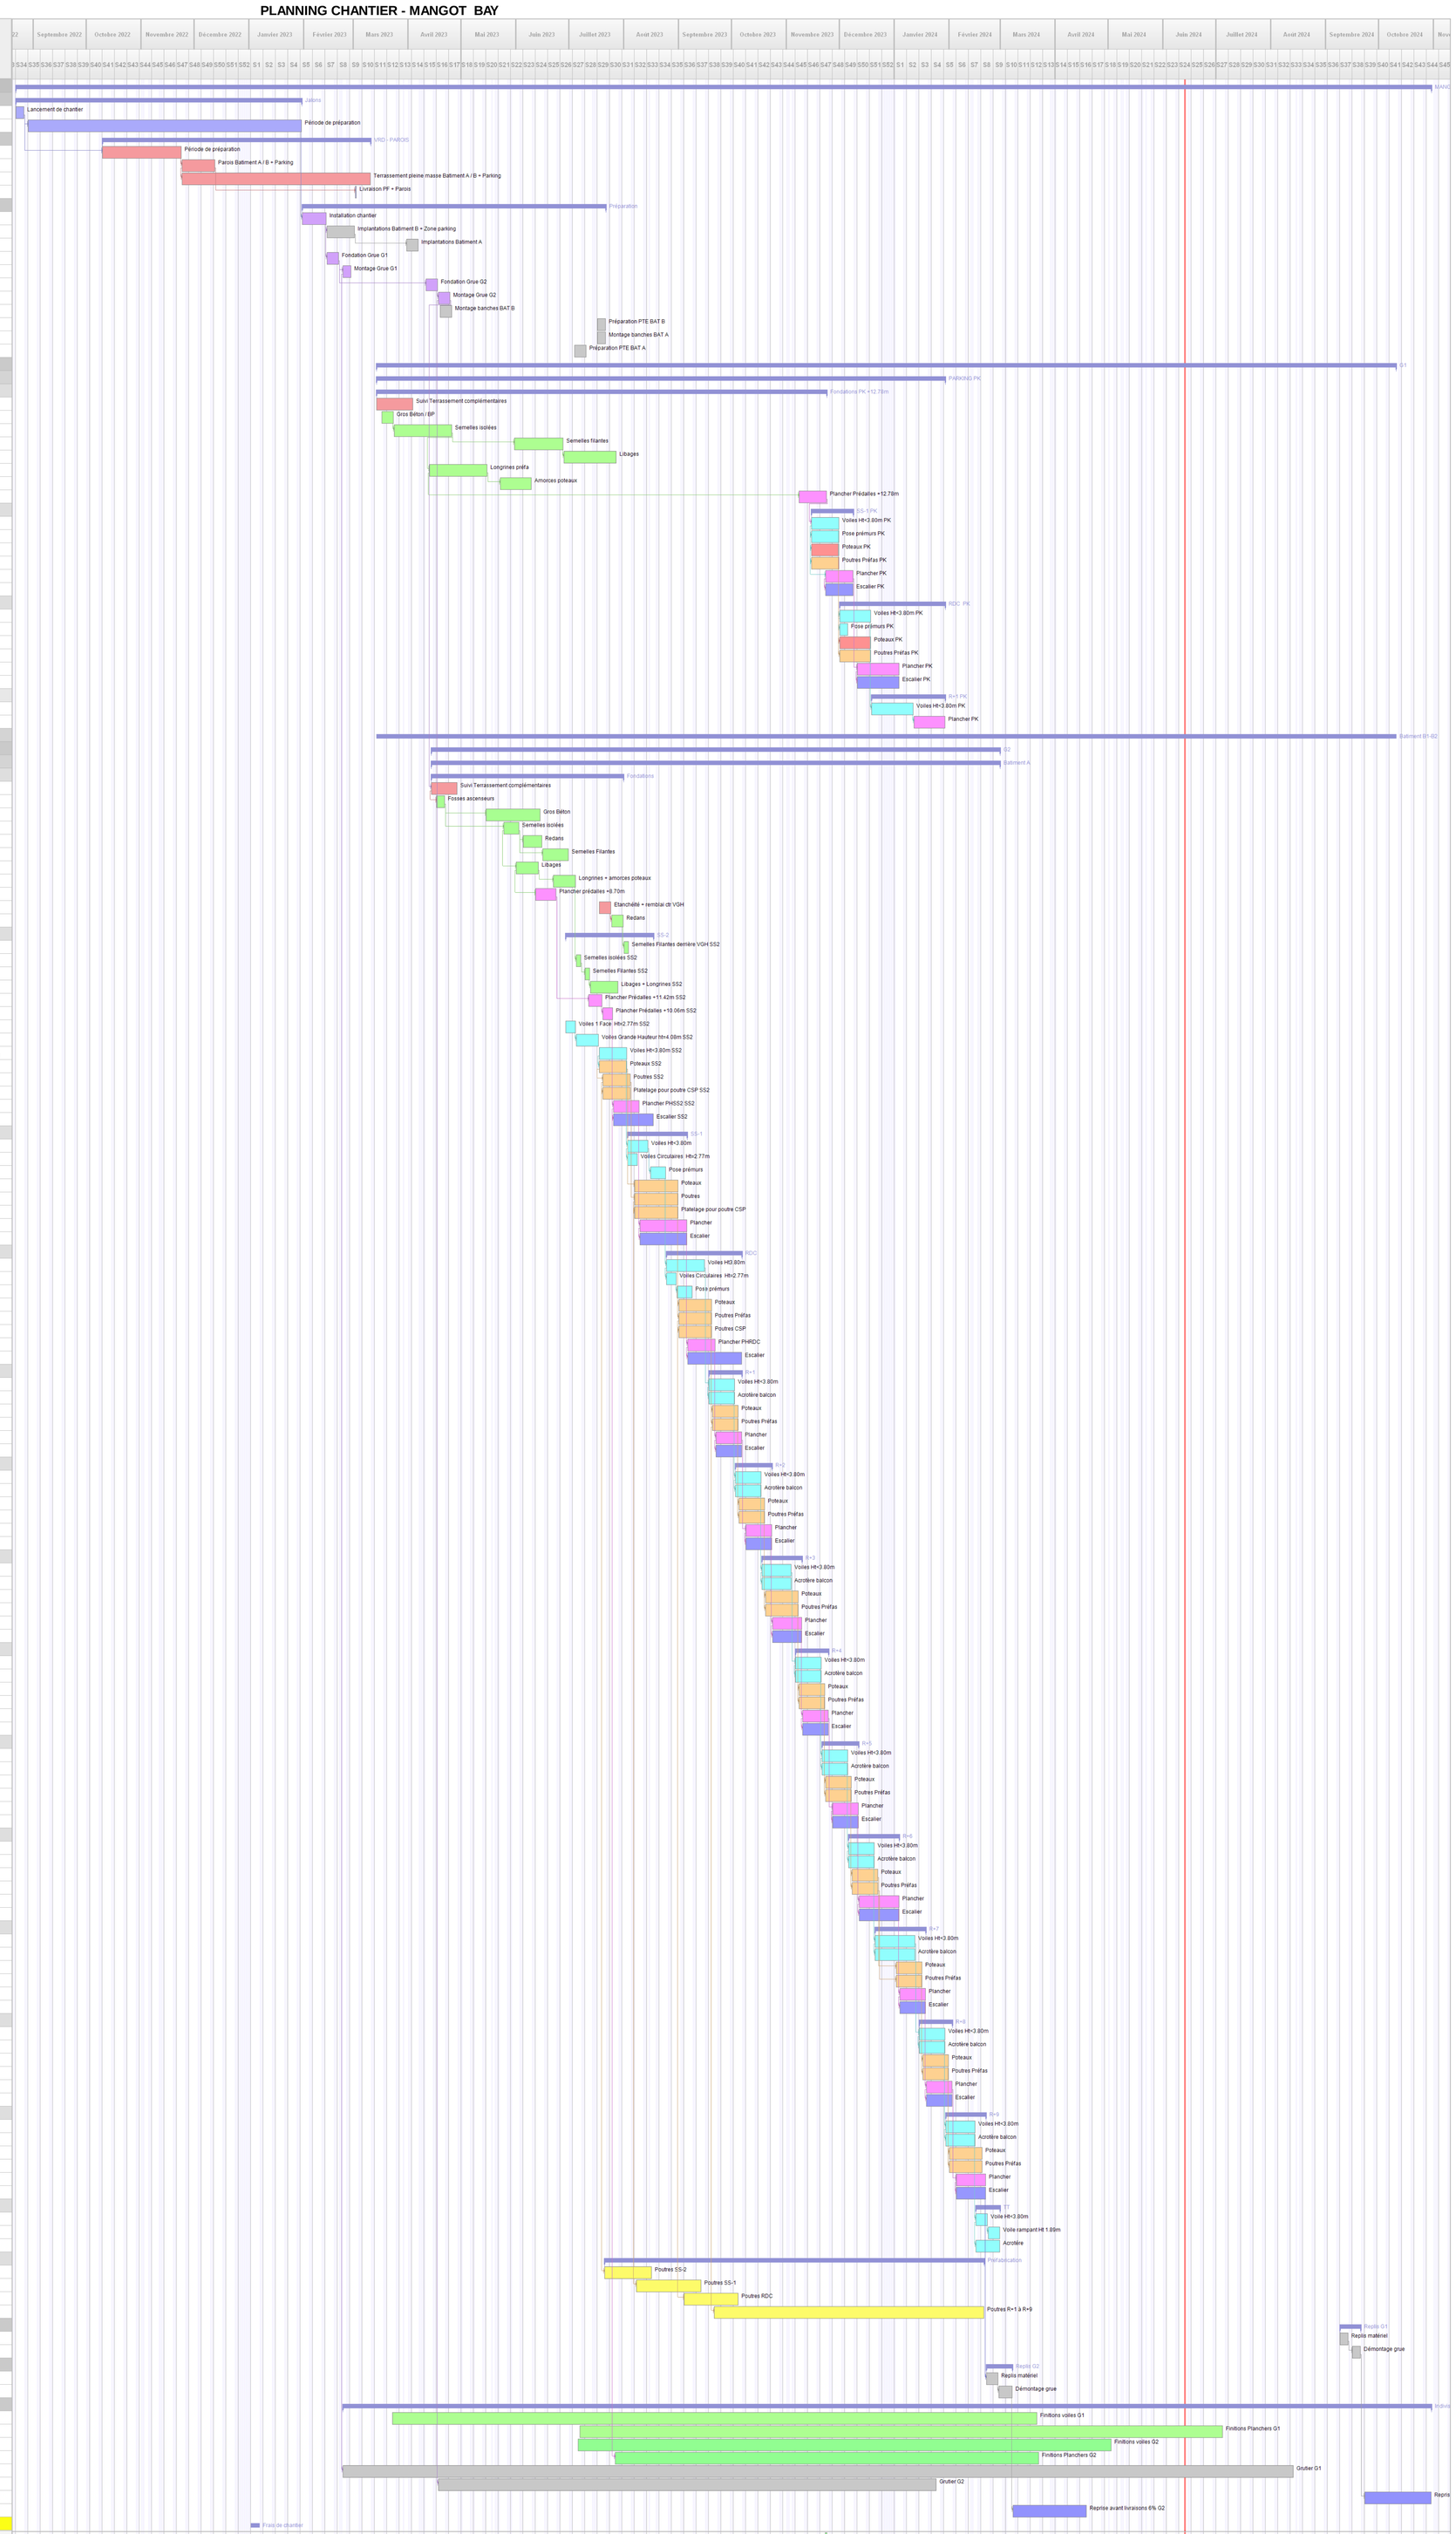
Septembre 2022
Octobre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Janvier 2023
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Juin 2023
Juillet 2023
Août 2023
Septembre 2023
Octobre 2023
Novembre 2023
Décembre 2023
Janvier 2024
Février 2024
Mars 2024
Avril 2024
Mai 2024
Juin 2024
Juillet 2024
Août 2024
Septembre 2024
Octobre 2024
Jalons
Lancement de chantier
Période de préparation
VRD - PAROIS
Parois Batiment A / B + Parking
Terrassement pleine masse Batiment A / B + Parking
Livraison PF + Parois
Préparation
Installation chantier
Implantations Batiment B + Zone parking
Implantations Batiment A
Fondation Grue G1
Montage Grue G1
Fondation Grue G2
Montage Grue G2
Montage banches BAT B
Préparation PTE BAT B
Montage banches BAT A
Préparation PTE BAT A
G1
PARKING PK
Fondations PK +12.78m
Suivi Terrassement complémentaires
Gros Béton / BP
Semelles isolées
Semelles filantes
Libages
Longrines préfa
Amorces poteaux
Plancher Prédalles +12.78m
SS-1 PK
Voiles Ht<3.80m PK
Pose prémurs PK
Poteaux PK
Poutres Préfas PK
Plancher PK
Escalier PK
RDC PK
R+1 PK
Batiment B1-B2
G2
Batiment A
Fondations
Fosses ascenseurs
Redans
Plancher prédalles +8.70m
Etanchéité + remblai ctr VGH
SS-2
Semelles Filantes derrière VGH SS2
Semelles isolées SS2
Semelles Filantes SS2
Libages + Longrines SS2
Plancher Prédalles +11.42m SS2
Plancher Prédalles +10.06m SS2
Voiles 1 Face Ht=2.77m SS2
Voiles Grande Hauteur ht=4.08m SS2
Voiles Ht<3.80m SS2
Poteaux SS2
Poutres SS2
Platelage pour poutre CSP SS2
Plancher PHSS2 SS2
Escalier SS2
SS-1
Voiles Circul
