EXEMPLE PLANNING CORPS D'ETAT

Numéro	Tâche	Quantité	Unité d'œuvre	Cadence	Durée	Date de début	Équipe	Effectif	Prédécesseurs	Remarques
1	**PLANNING CORPS D'ETATS**				40 j	10/06/2024				
2	GROS OEUVRE				5 j	10/06/2024	PEINTURES			
3	CHARPENTE COUVERTURE	180	M2	36 M2/j	5 j	17/06/2024	CHARPENTE		2FD	
4	MENUISERIE EXTERIEUR	20	U	6,67 U/j	3 j	20/06/2024	CLOISON DOUBLAGE		3DD+3	
5	PLOMBERIE	10	APP	0,67 APP/j	15 j	10/06/2024	PLOMB		2DD	
6	ELECTRICITE	50	U	3,33 U/j	15 j	10/06/2024	ELECTRICITE		2DD	
7	CLOISONS DOUBLAGE	180	M2	12 M2/j	15 j	24/06/2024	CLOISON DOUBLAGE		3FD	
8	MENUISERIE INTERIEURE	25	U	3,57 U/j	7 j	08/07/2024	MENUISERIE INTERIEURE		7DD+10	
9	CARRRELAGE	200	M2	20 M2/j	10 j	15/07/2024	CARRELAGE		7FD	
10	PEINTURES	300	M2	60 M2/j	5 j	29/07/2024	PEINTURES		9FD	

Code couleur des colonnes
Jours fériés
Aujourd'hui
Jours de provision d'intempéries/Aléas

	Heures	Frais de chantier
Feuille de vente	0h	
Planning MO	0h	
Reste à justifier	0h	
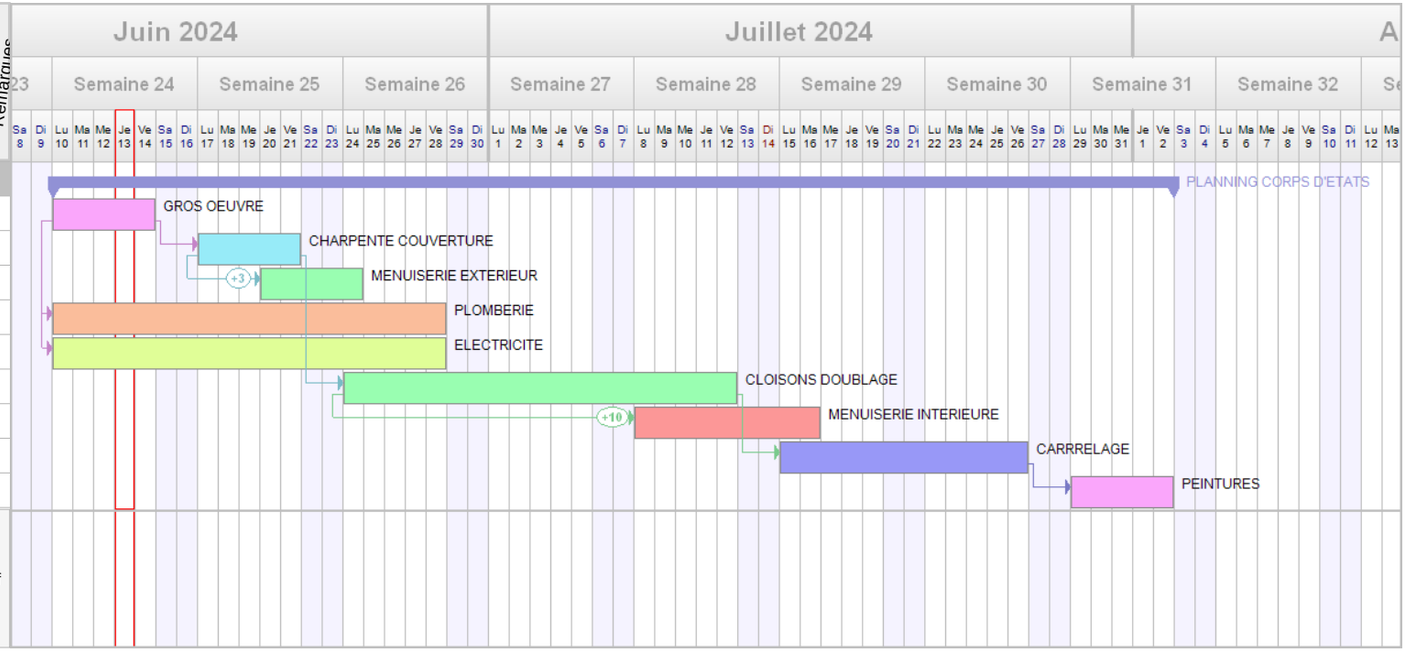
Total effectif
